



គម្រោងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មទឹកស្អាត និងអនាម័យជនបទជំហានទី ៣
THIRD RURAL WATER SUPPLY AND SANITATION SERVICES SECTOR DEVELOPMENT PROGRAM
(TRWSS-SDP)

LOANS: 3832/3833 AND GRANTS: 0670/0671-CAM

វឌ្ឍនភាព នៃការអនុវត្តគម្រោង
ឆ្នាំ ២០២២



By H.E. Srin Poutthy
Project Director

រយៈពេល នៃការអនុវត្តគម្រោង



សមាសភាគគម្រោង


គម្រោងនេះមាន ៣ សមាសភាគ៖

- សមាសភាគទី ១៖ ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង និងពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតជនបទ
- សមាសភាគទី ២៖ ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង និងពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេវាកម្មអនាម័យជនបទ
- សមាសភាគទី ៣៖ ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមន្ត្រីគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តគម្រោង និងការអប់រំ ផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍

វិសាលភាពនៃគម្រោង

គិតត្រឹម Batch ទី ១ ទី ២ ទី៣ និង
ទី ៤ អនុវត្តបាន៖

- ១០ ខេត្ត
- ១៨ ស្រុក
- ៥៦ ឃុំ
- ៥០០ ភូមិ
- ៥ ភូមិសម្រាប់ ATWGs

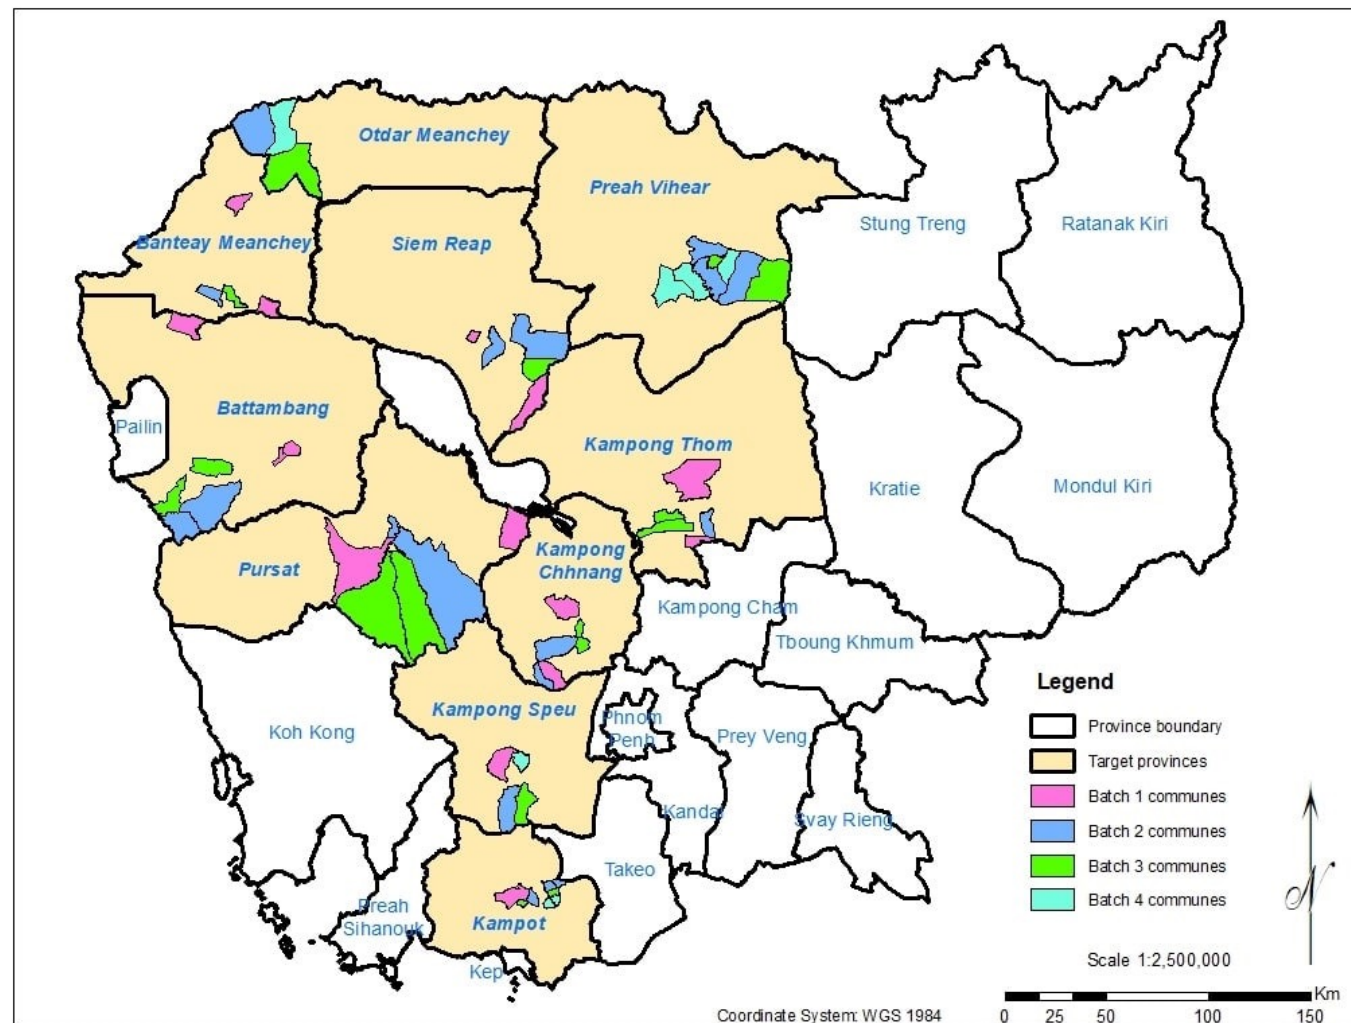

រចនាសម្ព័ន្ធ នៃក្រុមអនុវត្តគម្រោង

គណៈកម្មការសម្រប
សម្រួល៖

ប្រធាន 1, អនុ 2 និង
សមាជិក 18 នាក់

ក្រុមសម្របសម្រួល
គម្រោង

18 នាក់

7 នាក់: ប្រ.សម្រប
សម្រួល 1, ប្រ.
គ្រប់គ្រង 1 និង
បុគ្គលិក 5

ក្រុមអនុវត្ត
គម្រោង

ក្រុមទីប្រឹក្សា៖ អនុរ
ជាតិ 6 នាក់, ជាតិ 11
នាក់ និងប្រចាំតាម
ខេត្ត 20 នាក់

លទ្ធផល និងធាតុចេញរំពឹងទុករបស់គម្រោង

ប្រជាជនជនបទនៅស្រុកទាំង ១៨ ក្នុងខេត្តគោលដៅទាំង ១០ នឹង
ទទួលបានទឹកស្អាត និងអនាម័យប្រើប្រាស់ប្រកបដោយនិរន្តរភាព

ធាតុចេញទី ១៖ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងសេវា
កម្មផ្គត់ផ្គង់ទឹកជនបទត្រូវបានកែលម្អ និង
ពង្រីកបន្ថែម

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹក៖

- ✓ ជួសជុលស្រះសហគមន៍,
- ✓ ជួសជុល និងសាងសង់ថ្មីអណ្តូងស្នប់
- ✓ សាងសង់ពាងត្រងទឹកភ្លៀង
- ✓ សាងសង់ប្រព័ន្ធចែកចាយទឹកតាមបណ្តាញ
បំពង់ខ្នាតតូចសហគមន៍

ធាតុចេញទី ២៖ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និង
សេវាកម្មអនាម័យជនបទត្រូវបានកែលម្អ
និងពង្រីកបន្ថែម

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអនាម័យ៖

- ✓ សាងសង់បង្គន់គ្រួសារ
- ✓ សាងសង់បង្គន់សាធារណៈនៅតាម
សាលា និងមណ្ឌលសុខភាព
- ✓ សាងសង់អាងត្រងទឹកភ្លៀង

ធាតុចេញទី ៣៖ ពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ន
គ្រប់គ្រង និងធនធានមនុស្សក្នុងខេត្ត
គោលដៅ

ការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ន៖

- ✓ ការបណ្តុះបណ្តាលស្ថាប័ន
- ✓ រៀបចំបង្កើត និងបណ្តុះបណ្តាលក្រុម
អ្នកប្រើប្រាស់ទឹក
- ✓ ការអប់រំ ផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍

ចំនួន Batch ដែលគ្រោងនឹងមាន៖

Batch ទី ១

1A : 8 ឃុំ, 88 ភូមិ

1B : 7 ឃុំ, 65 ភូមិ

Batch ទី ២

18 ឃុំ, 168 ភូមិ

Batch ទី ៣

16 ឃុំ, 133 ភូមិ

Batch ទី ៤

7 ឃុំ, 49 ភូមិ

ម៉ាស៊ីនផលិតទឹកពីបរិយាកាស 5 ភូមិ

សរុបទាំង 4 Batch គឺ: 505 ភូមិ, 56
ឃុំ, 18 ស្រុក

វឌ្ឍនភាព នៃគម្រោងគិតត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២

ការងារលទ្ធកម្ម

1. សេវាទីប្រឹក្សា

- ក្រុមទីប្រឹក្សាអនុវត្តគម្រោង (PIC)
- ក្រុមទីប្រឹក្សាអនុវត្តកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍គោលនយោបាយជួសជុល និងថែទាំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតជនបទ

2. សំណង់ស៊ីវិល

- អនុគម្រោង Batch ទី ១
- អនុគម្រោង Batch ទី ២
- អនុគម្រោង Batch ទី ៣
- ម៉ាស៊ីនផលិតទឹកពីបរិយាកាស

3. ទំនិញ

- កុំព្យូទ័រ ម៉ាស៊ីនព្រីន និង GPS
- រថយន្ត ១៣ គ្រឿង
- ម៉ូតូ ៤៧ គ្រឿង
- ម៉ាស៊ីនតេស្តគុណភាពទឹកបឋម និងសារធាតុគីមីសម្រាប់តេស្តគុណភាពទឹក
- គ្រឿងសង្ហារឹម និងសម្ភារការិយាល័យ

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងអនាម័យជនបទសម្រេចបានគិតត្រឹមខែធ្នូ ២០២២

Batch ទី ១: បានជួសជុល និងសាងសង់រួចរាល់ ១០០% ក្នុងនោះមាន៖

- ជួសជុលស្រះសហគមន៍ 21
- ជួសជុលអណ្តូងទឹក ១០១ (អណ្តូងខ្វែង ៣១ និងអណ្តូងល្អ ៧០)
- សាងសង់អណ្តូងខ្វែងថ្មី ៧៥៤
- ពាងត្រងទឹកភ្លៀង ៤៥២១១
- ប្រព័ន្ធចែកចាយទឹកតាមបណ្តាញបំពង់ ២
- បង្គន់គ្រួសារ ៦៤៦២
- បង្គន់សាធារណៈ ៧៨ និងអាងត្រងទឹកភ្លៀង ៦៧



ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងអនាម័យជនបទសម្រេចបានគិតត្រឹមខែធ្នូ ២០២២ (ត)

Batch ទី ២: បានជួសជុល និងសាងសង់សម្រេច
បានដូចខាងក្រោម៖

- ស្រះសហគមន៍ ១៥ ធ្វើរួច ១០០%
- ជួសជុលអណ្តូងទឹក ៧១ ធ្វើរួច ១០០%
- អណ្តូងខ្វងថ្មី ៩០៩ ធ្វើរួច ១០០%
- ពាងត្រងទឹកភ្លៀង ៣៦,៤១៧ ធ្វើរួច ១០០%
- បង្គន់គ្រួសារ ៥,៩២០ ធ្វើរួច ១០០%
- បង្គន់សាធារណៈ ៦៩ និងអាងត្រងទឹកភ្លៀង ៧៩ ធ្វើរួច ១០០%



ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងអនាម័យជនបទសម្រេចបានគិតត្រឹមខែធ្នូ ២០២២ (ត)

Batch ទី ៣: បានធ្វើលទ្ធកម្មរួច។ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែល ត្រូវជួសជុល និងសាងសង់មានដូចខាងក្រោម៖

- ស្រះសហគមន៍ ៤ ធ្វើរួច ១០០%
- ជួសជុលអណ្តូងទឹក ១៨ ធ្វើរួច ១០០%
- អណ្តូងខ្វងថ្មី ៦៨៥ ធ្វើរួច ១០០%
- ពាងត្រងទឹកភ្លៀង ៣៥,៣៨៨ ធ្វើរួច ១០០%
- ប្រព័ន្ធចែកចាយទឹកតាមបណ្តាញបំពង់ ៤ ធ្វើរួច ១០០%



ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងអនាម័យជនបទសម្រេចបានគិតត្រឹមខែធ្នូ ២០២២ (ត)

Batch ទី ៤: បានជួសជុល និងសាងសង់សម្រេចបានដូចខាងក្រោម៖

- ស្រះសហគមន៍ ០៥
- ជួសជុលអណ្តូង ១១
- អណ្តូងខ្វងថ្មី ៣៦៦
- ពាងត្រងទឹកភ្លៀង ៤,៩៥៦
- ប្រព័ន្ធចែកចាយទឹកតាមបណ្តាញបំពង់ ៣
- អាងត្រងទឹកភ្លៀងបំពាក់ចម្រោះ ៤



ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងអនាម័យជនបទសម្រេចបានគិតត្រឹមខែធ្នូ ២០២២ (ត)

ម៉ាស៊ីនផលិតទឹកពីបរិយាកាស
(ATWGs)



ខេត្តចំនួន ០៥ (ព្រះវិហារ ឧត្តរមានជ័យ បន្ទាយមានជ័យ បាត់ដំបង និងកំពត) នឹងទទួលបាន ATWG

បច្ចុប្បន្ន ក្រុមហ៊ុនម៉ៅការ (CominKhmere) បានសាងសង់រួច ១០០%

សមិទ្ធផលសម្រេចបានធៀបនឹងគោលដៅគិតត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២

ល.រ	សកម្មភាព	គោលដៅ	សមិទ្ធផល	ភាគរយ %
ផ្នែកទឹកស្អាត				
1	ខេត្តគោលដៅ	១០	១០	100
2	ស្រុកគោលដៅ	១១	១២	109
3	ឃុំគោលដៅ	៤០	៥៦	140
4	ភូមិគោលដៅ	៤០០	៥០៥	126
5	អ្នកទទួលផល	៤០០០០០	៣៦៨៨៩០	92
6	ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតសម្រាប់សាលារៀន	១០០	៧៦	76
7	ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព	១២	៨	67
8	ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត	២៥០០	២៥៦៤	103
ផ្នែកអនាម័យ				
1	បង្គន់អនាម័យគ្រួសារ	៨០០០	១២៣៨២	155
២	បង្គន់អនាម័យសាធារណៈ (សាលារៀន)	១០០	១៣១	131
3	បង្គន់អនាម័យសាធារណៈ (មណ្ឌលសុខភាព)	១៦	១៦	100
៤	ODF ឃុំ	៤០	៨	20
5	២៧ ឃុំកំពុងឆែក និងកំណត់ ODF			

ក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់ទឹកស្អាត និងអនាម័យដែលបានបង្កើត

Batch	សរុប	WSUGs	SSC	HCC	WMC	ATWG
1	878	865	11	0	2	0
2	1000	965	28	2	0	5
3	711	664	37	6	4	0
4	375	340	28	4	3	0
សរុបរួម	2964	2834	104	12	9	5

សមាជិកគណៈកម្មការ: 14,820 នាក់; ស្ត្រី: 5,928 នាក់ 40%

សមិទ្ធផលសម្រេចបានធៀបនឹងគោលដៅគិតត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដែលបានរៀបចំកន្លងមក	
1	វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការងាររៀបចំរបាយការណ៍សិក្សាស័ក្តិសមគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលើផ្នែកបរិស្ថាន និងសង្គម (EDDR and SDDR) ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។
2	វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីជម្រើសសម្រាប់បង្កន់អនាម័យគ្រួសារ ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក និងការបង្កើតក្រុមអ្នកសន្សំប្រាក់សម្រាប់សាងសង់បង្គន់គ្រួសារ។
3	វគ្គបណ្តុះបណ្តាលឡើងវិញ ស្តីពីកម្មវិធីទឹកស្អាត និងអនាម័យតាមសាលារៀន មណ្ឌលសុខភាព និងវត្តអារាម។
4	វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និងយេនឌ័រ។
5	វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការរៀបចំផែនការសុវត្ថិភាពទឹក ការប្រតិបត្តិ និងការថែទាំនៃប្រព័ន្ធចែកចាយទឹកតាមបណ្តាញបំពង់ខ្នាតតូចសហគមន៍ និងស្រះសហគមន៍ ការគ្រប់គ្រងបរិស្ថានសម្រាប់ការងារសាងសង់សំណង់ស៊ីវិល ការធ្វើតេស្តគុណភាពទឹកនៅទីវាល និងការត្រួតពិនិត្យ តាមដានគុណភាពទឹក។
6	វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការប្រមូលទិន្នន័យព័ត៌មានសុវត្ថិភាពសង្គម និងបរិស្ថានសម្រាប់រៀបចំរបាយការណ៍សិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពអនុគម្រោង និងរបាយការណ៍ផ្ទៀងផ្ទាត់សុវត្ថិភាពសង្គម និងបរិស្ថាន។
7	វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីរបៀបអង្កេតផលប៉ះពាល់របស់ Batch ១
8	វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីបែបបទនៃការទទួល និងដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹងតវ៉ារបស់ជនរងគ្រោះដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយការអនុវត្តគម្រោង។
9	វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការប្រើប្រាស់ និងការបំពេញប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធ PPMS
10	វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការប្រមូល និងបង្ហាញទិន្នន័យ និងព័ត៌មាន គុណភាព (Qualitative data/information)
11	វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យ តាមដានផែនការសុវត្ថិភាពទឹក និងអនាម័យ
12	វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការដាក់បញ្ចូលការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយទៅក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និង អនាម័យ និងរបៀបរៀបចំផែនការសុវត្ថិភាពទឹក និងអនាម័យសម្រាប់ឃុំ នឹងស្រុក ។
13	វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ និងផែនការសកម្មភាពក្រោយ ODF
14	វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានភូមិសាស្ត្រ (GIS) ក្នុងការរៀបចំផែនទី និងបង្កើតទិន្នន័យ GIS សម្រាប់អណ្តូងខ្វែងទាំងអស់របស់គម្រោងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មទឹកស្អាត និងអនាម័យជនបទជំហានទី ៣។

ការងារសុវត្ថិភាព និងផែនការសកម្មភាពរបស់យេនឌ័រ(GAP)

ការងារសុវត្ថិភាព

- របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសលើកទី ៣ ស្តីពីសុវត្ថិភាពបានដាក់ជូន និងអនុម័តដោយ ADB នៅខែសីហា ឆ្នាំ 2021 ។
- យន្តការទទួល និងដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា (GRM)
 - គណៈកម្មាការទទួល និងដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ាបានបង្កើតរួចរាល់នៅតាមខេត្តគោលដៅ
 - កន្លែងមក គ្មានបណ្តឹងតវ៉ាទេ

ផែនការសកម្មភាពរបស់យេនឌ័រ(GAP)

- ទិន្នន័យមូលដ្ឋានសម្រាប់យេនឌ័របានប្រមូលរួច
 - មានទិន្នន័យយេនឌ័រសម្រាប់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទាំង 10 ខេត្តគោលដៅ។
 - ទិន្នន័យយេនឌ័រសម្រាប់សាលារៀន មណ្ឌលសុខភាពដែលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ទឹក កំពុងតែប្រមូល
- គោលដៅដែលចង់បានស្តីចូលរួមចំនួន ៤០% នៅមិនទាន់សម្រេចបាន
 - យើងនឹងបណ្តុះបណ្តាលស្ត្រី ១៣ នាក់បន្ថែមដើម្បីទទួលបានគោលដៅ ៤០% នៃការចូលរួមរបស់ស្ត្រី។

ការងារហិរញ្ញវត្ថុ

ថវិកា ក្នុងផែនការ (លាន US\$)	បរិមាណនៃកិច្ចសន្យាដែលបានផ្តល់		បរិមាណដែលបានចំណាយ	
	បរិមាណ (លាន US\$)	%	បរិមាណ (Million US\$)	%
Grant 0670 4.39	3.23	73	1.98	45
Grant 0671	1.00	0	0	0
Loan 3833-CAM 29.61	18.93	64	13.16	36
Loan 3832-CAM 15.00	5.00	33	5.00	33

បញ្ហាប្រឈម

បញ្ហាប្រឈម

បញ្ហាប្រឈម	ការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះស្រាយ
គ្រោះទឹកជំនន់ខ្លាំងបណ្តាលឲ្យការងារសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតជនបទ ដូចជាស្រះសហគមន៍អណ្តូងទឹកជាដើម មានការយឺតយ៉ាវ។	ក្រុមអនុវត្តគម្រោងថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ខេត្តបានខិតខំជំរុញក្រុមហ៊ុនមេ្តាការឲ្យធ្វើការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតជនបទឲ្យហើយតាមពេលកំណត់។
ការចូលរួមរបស់សហគមន៍ ដូចជា ការធ្វើរបងស្រះសហគមន៍ និងអណ្តូង និងការចូលរួមវិភាគទានសម្រាប់ការថែទាំមានការយឺតយ៉ាវ។	ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ និងក្រុមអនុវត្តគម្រោងថ្នាក់ខេត្តត្រូវចូលរួមឲ្យបានខ្លាំងក្លាក្នុងការជំរុញបន្ថែម ដល់សហគមន៍ឲ្យចូលរួមវិភាគទានតាមការសន្យារបស់ពួកគាត់។
ការសាងសង់បង្គន់គ្រួសារដោយប្រើថវិកាផ្ទាល់ខ្លួន ខេត្តខ្លះនៅមានចំនួនតិចតួច។	ក្រុមអនុវត្តគម្រោងថ្នាក់ខេត្តត្រូវសហការជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំ និងភូមិបន្តជំរុញបន្ថែម ដល់សហគមន៍ឲ្យចូលរួមធ្វើបង្គន់គ្រួសារដោយប្រើថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ប្រើប្រាស់ និងបញ្ចប់ការបន្ទោរបង់ពាសវាលពាសកាល។

*Thank
You!*

